



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
1	Projecto Sinergic - Execução Cadastro 1ª fase	1167 d	Mon 20-07-09	Mon 10-03-14						
2	Gestão do Projecto	1167 d	Mon 20-07-09	Mon 10-03-14						
3	Início do Projecto	31 d	Mon 20-07-09	Mon 31-08-09						
4	Arranque Operação Lote 1	24 d	Mon 20-07-09	Thu 20-08-09						
5	Levantamento de necessidades para operação	4 d	Mon 20-07-09	Thu 23-07-09						
6	Elaboração do documento de definição do âmbito	20 d	Fri 24-07-09	Thu 20-08-09	5					
7	Documento de definição aprovado	0 d	Thu 20-08-09	Thu 20-08-09	6					
8	Arranque da Contratação	7 d	Fri 21-08-09	Mon 31-08-09						
9	Levantamento de necessidades para início de contratação	2 d	Fri 21-08-09	Mon 24-08-09	7					
10	Elaboração checklist para contratação	0 d	Mon 24-08-09	Mon 24-08-09	9					
11	Elaboração do plano do projecto	5 d	Tue 25-08-09	Mon 31-08-09	10					
12	Plano do Projecto aprovado	0 d	Mon 31-08-09	Mon 31-08-09	11					
13	Planeamento do Projecto	199 d	Tue 01-09-09	Thu 17-06-10						
14	Planeamento da Contratação	164 d	Tue 01-09-09	Tue 27-04-10						
15	Preparação da Contratação	114 d	Tue 01-09-09	Fri 12-02-10						
16	Abertura do Procedimento	11 d	Tue 01-09-09	Tue 15-09-09						
17	Elaboração das peças do concurso	9 d	Tue 01-09-09	Fri 11-09-09	12					
18	Envio da abertura do procedimento	0 d	Fri 11-09-09	Fri 11-09-09	17					
19	Aprovação da abertura do procedimento	2 d	Mon 14-09-09	Tue 15-09-09	18					
20	Notificação da aprovação	0 d	Tue 15-09-09	Tue 15-09-09	19					
21	Publicitação	1 d	Wed 16-09-09	Wed 16-09-09						
22	Elaboração anúncios em DR e JO	1 d	Wed 16-09-09	Wed 16-09-09	20					
23	Envio dos anúncios e peças	0 d	Wed 16-09-09	Wed 16-09-09	22					
24	Apresentação de Propostas	35 d	Thu 17-09-09	Thu 05-11-09						
25	Pedidos de esclarecimentos pelos interessados	11 d	Thu 17-09-09	Thu 01-10-09	23					
26	Elaboração dos esclarecimentos	12 d	Fri 02-10-09	Tue 20-10-09	25					
27	Apresentação dos esclarecimentos	0 d	Tue 20-10-09	Tue 20-10-09	26					
28	restante prazo para apresentação	12 d	Wed 21-10-09	Thu 05-11-09	27					
29	fim da apresentação de propostas	0 d	Thu 05-11-09	Thu 05-11-09	28					
30	Acto Público	4 d	Fri 06-11-09	Wed 11-11-09						
31	Preparação e realização do acto público	1 d	Fri 06-11-09	Fri 06-11-09	29					
32	Propostas abertas	0 d	Fri 06-11-09	Fri 06-11-09	31					
33	Periodo de reclamação	3 d	Mon 09-11-09	Wed 11-11-09	32					
34	Fim periodo de reclamação	0 d	Wed 11-11-09	Wed 11-11-09	33					
35	Análise e Avaliação das Propostas	24 d	Tue 17-11-09	Tue 22-12-09						
36	1ª avaliação das propostas	7 d	Tue 17-11-09	Wed 25-11-09	34FS+3 d					
37	Solicitação de esclarecimentos	0 d	Wed 25-11-09	Wed 25-11-09	36					
38	Apresentação esclarecimentos	7 d	Wed 02-12-09	Fri 11-12-09	37FS+3 d					
39	2ª avaliação das propostas	7 d	Mon 14-12-09	Tue 22-12-09	38					
40	Envio relatório preliminar	0 d	Tue 22-12-09	Tue 22-12-09	39					

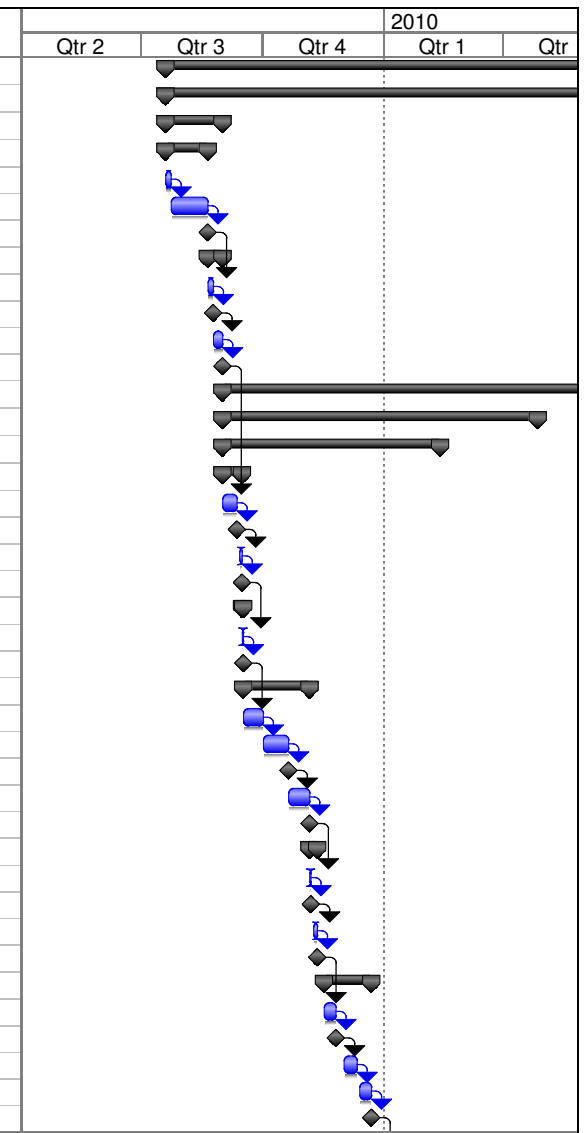

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
41	Audiência Prévia	5 d	Tue 29-12-09	Tue 05-01-10						
42	Período de audiência previa	5 d	Tue 29-12-09	Tue 05-01-10	40FS+3 d					
43	fim audiência previa	0 d	Tue 05-01-10	Tue 05-01-10	42					
44	Adjudicação	11 d	Mon 11-01-10	Mon 25-01-10						
45	Elaboração relatório final	9 d	Mon 11-01-10	Thu 21-01-10	43FS+3 d					
46	Envio para aprovação	0 d	Thu 21-01-10	Thu 21-01-10	45					
47	Aprovação/Adjudicação	2 d	Fri 22-01-10	Mon 25-01-10	46					
48	Notificação da adjudicação	0 d	Mon 25-01-10	Mon 25-01-10	47					
49	Apresentação Documentação	11 d	Fri 29-01-10	Fri 12-02-10						
50	Período para apresentação dos do	10 d	Fri 29-01-10	Thu 11-02-10	48FS+3 d					
51	Verificação Documentos	1 d	Fri 12-02-10	Fri 12-02-10	50					
52	Documentos verificados	0 d	Fri 12-02-10	Fri 12-02-10	51					
53	Publicitação da Adjudicação	3 d	Tue 26-01-10	Thu 28-01-10						
54	Elaboração do anúncio e do relató	3 d	Tue 26-01-10	Thu 28-01-10	48					
55	Envio da publicação para o JOUE	0 d	Thu 28-01-10	Thu 28-01-10	54					
56	Celebração Contrato	52 d	Thu 11-02-10	Tue 27-04-10						
57	Elaboração contrato escrito	15 d	Thu 11-02-10	Thu 04-03-10	68					
58	Envio para aprovação	0 d	Thu 04-03-10	Thu 04-03-10	57					
59	Aprovação minuta contrato	3 d	Fri 05-03-10	Tue 09-03-10	58					
60	Notificação minuta	0 d	Tue 09-03-10	Tue 09-03-10	59					
61	Minuta aceite	0 d	Fri 12-03-10	Fri 12-03-10	60FS+3 d					
62	Comunicação da outorga	1 d	Wed 21-04-10	Wed 21-04-10	63FS-5 d					
63	Outorga	1 d	Tue 27-04-10	Tue 27-04-10	61FS+30 d;52;4					
64	contrato celebrado	0 d	Tue 27-04-10	Tue 27-04-10	63					
65	Planeamento da Operação Lote 1	94 d	Tue 02-02-10	Thu 17-06-10						
66	Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1	5 d	Tue 02-02-10	Mon 08-02-10	48FS+5 d					
67	Elaboração escrita do acordo estabelecido r	2 d	Tue 09-02-10	Wed 10-02-10	66					
68	Documento do acordo aprovado	0 d	Wed 10-02-10	Wed 10-02-10	67					
69	preparação entrega cartões de identificação	1 d	Thu 17-06-10	Thu 17-06-10	242FS-16 d					
70	entrega dos cartões de identificação dos m	0 d	Thu 17-06-10	Thu 17-06-10	69					
71	Monitorização e Controlo do Projecto	972 d	Wed 28-04-10	Mon 10-03-14						
72	Monitorização e Controlo do Contrato	972 d	Wed 28-04-10	Mon 10-03-14						
73	Fiscalização Prévia	39 d	Wed 28-04-10	Wed 23-06-10						
74	Elaboração do processo para Fiscaliza	5 d	Wed 28-04-10	Tue 04-05-10	64					
75	Remessa processo para TC	0 d	Tue 04-05-10	Tue 04-05-10	74					
76	Verificação do Visto	30 d	Mon 10-05-10	Tue 22-06-10	75FS+3 d					
77	Visto Prévio concedido	0 d	Tue 22-06-10	Tue 22-06-10	76					
78	Preparação da Notificação da concessã	1 d	Wed 23-06-10	Wed 23-06-10	77					
79	Envio da notificação	0 d	Wed 23-06-10	Wed 23-06-10	78					
80	Obrigações Financeiras do Contrato	757 d	Fri 06-08-10	Mon 12-08-13						



Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
81	Preparação do pagamento 1ª prestação	1 d	Fri 06-08-10	Fri 06-08-10	242FS+20 d					
82	Pagamento 1ª prestação Bloco A	0 d	Fri 06-08-10	Fri 06-08-10	81					
83	Preparação do pagamento 2ª prestação	1 d	Thu 13-01-11	Thu 13-01-11	249FS+20 d					
84	Pagamento 2ª prestação Bloco A	0 d	Thu 13-01-11	Thu 13-01-11	83					
85	Preparação do pagamento 3ª prestação	1 d	Thu 05-01-12	Thu 05-01-12	266FS+20 d					
86	Pagamento 3ª prestação Bloco A	0 d	Thu 05-01-12	Thu 05-01-12	85					
87	Preparação do pagamento 4ª prestação	1 d	Fri 22-06-12	Fri 22-06-12	276FS+20 d					
88	Pagamento 4ª prestação Bloco A	0 d	Fri 22-06-12	Fri 22-06-12	87					
89	Preparação do pagamento 1ª prestação	1 d	Fri 23-09-11	Fri 23-09-11	328FS+20 d					
90	Pagamento 1ª prestação Bloco B	0 d	Fri 23-09-11	Fri 23-09-11	89					
91	Preparação do pagamento 2ª prestação	1 d	Fri 02-03-12	Fri 02-03-12	335FS+20 d					
92	Pagamento 2ª prestação Bloco B	0 d	Fri 02-03-12	Fri 02-03-12	91					
93	Preparação do pagamento 3ª prestação	1 d	Fri 22-02-13	Fri 22-02-13	352FS+20 d					
94	Pagamento 3ª prestação Bloco B	0 d	Fri 22-02-13	Fri 22-02-13	93					
95	Preparação do pagamento 4ª prestação	1 d	Mon 12-08-13	Mon 12-08-13	362FS+20 d					
96	Pagamento 4ª prestação Bloco B	0 d	Mon 12-08-13	Mon 12-08-13	95					
97	Fiscalização Sucessiva	769 d	Tue 01-02-11	Fri 21-02-14						
98	preparação da 1ª prestação de contas	15 d	Tue 01-02-11	Mon 21-02-11						
99	entrega da 1ª prestação de contas ao T	0 d	Mon 21-02-11	Mon 21-02-11	98					
100	preparação da 2ª prestação de contas	15 d	Wed 01-02-12	Wed 22-02-12						
101	entrega da 2ª prestação de contas ao T	0 d	Wed 22-02-12	Wed 22-02-12	100					
102	preparação da 3ª prestação de contas	15 d	Fri 01-02-13	Fri 22-02-13						
103	entrega da 3ª prestação de contas ao T	0 d	Fri 22-02-13	Fri 22-02-13	102					
104	preparação da 4ª prestação de contas	15 d	Mon 03-02-14	Fri 21-02-14						
105	entrega da 4ª prestação de contas ao T	0 d	Fri 21-02-14	Fri 21-02-14	104					
106	Obrigações Estatísticas	759 d	Tue 01-03-11	Mon 10-03-14						
107	preparação dados estatísticos segundo	5 d	Tue 01-03-11	Mon 07-03-11						
108	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	Mon 07-03-11	Mon 07-03-11	107					
109	preparação dados estatísticos segundo	5 d	Thu 01-03-12	Wed 07-03-12						
110	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	Wed 07-03-12	Wed 07-03-12	109					
111	preparação dados estatísticos segundo	5 d	Fri 01-03-13	Thu 07-03-13						
112	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	Thu 07-03-13	Thu 07-03-13	111					
113	preparação dados estatísticos segundo	5 d	Mon 03-03-14	Mon 10-03-14						
114	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	Mon 10-03-14	Mon 10-03-14	113					
115	Monitorização e Controlo da Operação Lote 1	747 d	Mon 09-08-10	Tue 30-07-13						
116	Bloco A	416 d	Mon 09-08-10	Mon 02-04-12						
117	Avaliações da situação mensal	413 d	Mon 09-08-10	Wed 28-03-12						
118	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	Mon 09-08-10	Mon 09-08-10	243SS+21 d					
119	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	Tue 07-09-10	Tue 07-09-10	243SS+42 d					
120	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	Thu 07-10-10	Thu 07-10-10	243SS+63 d					

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
121	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	Mon 25-10-10	Mon 25-10-10	243SS+75 d					
122	buffer para avaliação situação de e	1 d	Tue 09-11-10	Tue 09-11-10	245					
123	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Wed 24-11-10	Wed 24-11-10	251SS+21 d					
124	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Mon 27-12-10	Mon 27-12-10	251SS+42 d					
125	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Tue 25-01-11	Tue 25-01-11	251SS+63 d					
126	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Wed 23-02-11	Wed 23-02-11	251SS+84 d					
127	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Fri 25-03-11	Fri 25-03-11	251SS+105 d					
128	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Wed 27-04-11	Wed 27-04-11	251SS+126 d					
129	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Thu 26-05-11	Thu 26-05-11	251SS+147 d					
130	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Tue 28-06-11	Tue 28-06-11	251SS+168 d					
131	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Wed 10-08-11	Wed 10-08-11	251SS+199 d					
132	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	Fri 26-08-11	Fri 26-08-11	251SS+210 d					
133	buffer para avaliação situação de e	1 d	Mon 10-10-11	Mon 10-10-11	262					
134	Avaliação situação CP bloco A	1 d	Fri 06-01-12	Fri 06-01-12	268SS+21 d					
135	Avaliação situação CP bloco A	1 d	Mon 06-02-12	Mon 06-02-12	268SS+42 d					
136	Avaliação situação CP bloco A	1 d	Wed 14-03-12	Wed 14-03-12	268SS+68 d					
137	buffer para avaliação situação de e	1 d	Wed 28-03-12	Wed 28-03-12	269					
138	Reuniões mensais	413 d	Thu 12-08-10	Mon 02-04-12						
139	Reunião situação AQS bloco A	1 d	Thu 12-08-10	Thu 12-08-10	118FS+2 d					
140	Reunião situação AQS bloco A	1 d	Fri 10-09-10	Fri 10-09-10	119FS+2 d					
141	Reunião situação AQS bloco A	1 d	Tue 12-10-10	Tue 12-10-10	120FS+2 d					
142	Reunião situação AQS bloco A	1 d	Thu 28-10-10	Thu 28-10-10	121FS+2 d					
143	buffer reunião situação exceção /	1 d	Fri 12-11-10	Fri 12-11-10	122FS+2 d					
144	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Mon 29-11-10	Mon 29-11-10	123FS+2 d					
145	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Thu 30-12-10	Thu 30-12-10	124FS+2 d					
146	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Fri 28-01-11	Fri 28-01-11	125FS+2 d					
147	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Mon 28-02-11	Mon 28-02-11	126FS+2 d					
148	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Wed 30-03-11	Wed 30-03-11	127FS+2 d					
149	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Mon 02-05-11	Mon 02-05-11	128FS+2 d					
150	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Tue 31-05-11	Tue 31-05-11	129FS+2 d					
151	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Fri 01-07-11	Fri 01-07-11	130FS+2 d					
152	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Tue 16-08-11	Tue 16-08-11	131FS+2 d					
153	Reunião situação ADC bloco A	1 d	Wed 31-08-11	Wed 31-08-11	132FS+2 d					
154	buffer reunião situação exceção /	1 d	Thu 13-10-11	Thu 13-10-11	133FS+2 d					
155	Reunião situação CP bloco A	1 d	Wed 11-01-12	Wed 11-01-12	134FS+2 d					
156	Reunião situação CP bloco A	1 d	Thu 09-02-12	Thu 09-02-12	135FS+2 d					
157	Reunião situação CP bloco A	1 d	Mon 19-03-12	Mon 19-03-12	136FS+2 d					
158	buffer reunião situação exceção C	1 d	Mon 02-04-12	Mon 02-04-12	137FS+2 d					
159	Bloco B	462 d	Mon 26-09-11	Tue 30-07-13						
160	Avaliação situação mensal	459 d	Mon 26-09-11	Thu 25-07-13						

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
161	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	Mon 26-09-11	Mon 26-09-11	329SS+21 d					
162	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	Wed 26-10-11	Wed 26-10-11	329SS+42 d					
163	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	Fri 25-11-11	Fri 25-11-11	329SS+63 d					
164	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	Thu 15-12-11	Thu 15-12-11	329SS+75 d					
165	buffer para avaliação situação de e	1 d	Thu 29-12-11	Thu 29-12-11	331					
166	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Fri 13-01-12	Fri 13-01-12	337SS+21 d					
167	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Mon 13-02-12	Mon 13-02-12	337SS+42 d					
168	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Wed 14-03-12	Wed 14-03-12	337SS+63 d					
169	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Fri 13-04-12	Fri 13-04-12	337SS+84 d					
170	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Wed 16-05-12	Wed 16-05-12	337SS+105 d					
171	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Fri 15-06-12	Fri 15-06-12	337SS+126 d					
172	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Mon 16-07-12	Mon 16-07-12	337SS+147 d					
173	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Tue 14-08-12	Tue 14-08-12	337SS+168 d					
174	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Thu 27-09-12	Thu 27-09-12	337SS+199 d					
175	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	Mon 15-10-12	Mon 15-10-12	337SS+210 d					
176	buffer para avaliação situação de e	1 d	Tue 27-11-12	Tue 27-11-12	348					
177	Avaliação situação CP bloco B	1 d	Mon 25-02-13	Mon 25-02-13	354SS+21 d					
178	Avaliação situação CP bloco B	1 d	Tue 26-03-13	Tue 26-03-13	354SS+42 d					
179	Avaliação situação CP bloco B	1 d	Mon 06-05-13	Mon 06-05-13	354SS+68 d					
180	buffer para avaliação situação de e	1 d	Mon 20-05-13	Mon 20-05-13	355					
181	Avaliação fecho operação	1 d	Thu 25-07-13	Thu 25-07-13	397					
182	Reuniões Mensais	459 d	Thu 29-09-11	Tue 30-07-13						
183	Reunião situação AQS bloco B	1 d	Thu 29-09-11	Thu 29-09-11	161FS+2 d					
184	Reunião situação AQS bloco B	1 d	Mon 31-10-11	Mon 31-10-11	162FS+2 d					
185	Reunião situação AQS bloco B	1 d	Wed 30-11-11	Wed 30-11-11	163FS+2 d					
186	Reunião situação AQS bloco B	1 d	Tue 20-12-11	Tue 20-12-11	164FS+2 d					
187	buffer reunião situação exceção /	1 d	Tue 03-01-12	Tue 03-01-12	165FS+2 d					
188	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Wed 18-01-12	Wed 18-01-12	166FS+2 d					
189	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Thu 16-02-12	Thu 16-02-12	167FS+2 d					
190	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Mon 19-03-12	Mon 19-03-12	168FS+2 d					
191	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Wed 18-04-12	Wed 18-04-12	169FS+2 d					
192	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Mon 21-05-12	Mon 21-05-12	170FS+2 d					
193	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Wed 20-06-12	Wed 20-06-12	171FS+2 d					
194	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Thu 19-07-12	Thu 19-07-12	172FS+2 d					
195	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Mon 20-08-12	Mon 20-08-12	173FS+2 d					
196	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Tue 02-10-12	Tue 02-10-12	174FS+2 d					
197	Reunião situação ADC bloco B	1 d	Thu 18-10-12	Thu 18-10-12	175FS+2 d					
198	buffer reunião situação exceção /	1 d	Fri 30-11-12	Fri 30-11-12	176FS+2 d					
199	Reunião situação CP bloco B	1 d	Thu 28-02-13	Thu 28-02-13	177FS+2 d					
200	Reunião situação CP bloco B	1 d	Mon 01-04-13	Mon 01-04-13	178FS+2 d					

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
201	Reunião situação CP bloco B	1 d	Thu 09-05-13	Thu 09-05-13	179FS+2 d					
202	buffer reunião situação excepção C	1 d	Thu 23-05-13	Thu 23-05-13	180FS+2 d					
203	Reunião fecho operação	1 d	Tue 30-07-13	Tue 30-07-13	181FS+2 d					
204	Conclusão do Projecto	12 d	Thu 25-07-13	Fri 09-08-13						
205	Encerramento da Operação no Lote 1	12 d	Thu 25-07-13	Fri 09-08-13						
206	Elaboração da Publicação da conclusão da	3 d	Thu 25-07-13	Mon 29-07-13	397					
207	Envio publicação	0 d	Mon 29-07-13	Mon 29-07-13	206					
208	Revisão dos resultados obtidos	5 d	Wed 31-07-13	Tue 06-08-13	203					
209	Elaboração do Relatório de Encerramento d	2 d	Wed 07-08-13	Thu 08-08-13	208					
210	Revisão do Relatório de Encerramento da C	1 d	Fri 09-08-13	Fri 09-08-13	209					
211	Relatório de Encerramento da Operação ap	0 d	Fri 09-08-13	Fri 09-08-13	210					
212	Operação Lote 1 Terminado	0 d	Fri 09-08-13	Fri 09-08-13	211					
213	Encerramento do Contrato	6 d	Wed 31-07-13	Wed 07-08-13						
214	Elaboração do Relatório de Encerramento d	3 d	Wed 31-07-13	Fri 02-08-13	203					
215	Envio para aprovação	0 d	Fri 02-08-13	Fri 02-08-13	214					
216	Aprovação do Relatório de Encerramento de	2 d	Mon 05-08-13	Tue 06-08-13	215					
217	Notificação da aprovação	0 d	Tue 06-08-13	Tue 06-08-13	216					
218	Libertação da caução	1 d	Wed 07-08-13	Wed 07-08-13	217					
219	Contrato Encerrado	0 d	Wed 07-08-13	Wed 07-08-13	218					
220	Execução do Cadastro Predial Lote 1	764 d	Thu 08-07-10	Wed 24-07-13						
221	Bloco A	471 d	Thu 08-07-10	Wed 23-05-12						
222	Publicitação	286 d	Mon 26-07-10	Mon 12-09-11						
223	Início operação	42 d	Mon 26-07-10	Tue 21-09-10						
224	Campanha de publicitação	2 d	Mon 26-07-10	Tue 27-07-10						
225	elaboração de editais e anúncios I	2 d	Mon 26-07-10	Tue 27-07-10	244					
226	envio para afixação e comunicação	0 d	Tue 27-07-10	Tue 27-07-10	225					
227	Ações de sensibilização	32 d	Mon 09-08-10	Tue 21-09-10						
228	preparação de acções de sensibili	2 d	Mon 09-08-10	Tue 10-08-10	232FS+5 d					
229	acções de sensibilização freguesia	30 d	Wed 11-08-10	Tue 21-09-10	228					
230	Notificação directa da operação	5 d	Mon 26-07-10	Fri 30-07-10						
231	elaboração e impressão de cartas	5 d	Mon 26-07-10	Fri 30-07-10	244					
232	envio de cartas IOBA	0 d	Fri 30-07-10	Fri 30-07-10	231					
233	Consulta pública	3 d	Thu 08-09-11	Mon 12-09-11						
234	Campanha de publicitação	1 d	Thu 08-09-11	Thu 08-09-11						
235	elaboração de editais e anúncios C	1 d	Thu 08-09-11	Thu 08-09-11	261					
236	envio para afixação e comunicação	0 d	Thu 08-09-11	Thu 08-09-11	235					
237	Notificação directa da consulta públi	3 d	Thu 08-09-11	Mon 12-09-11						
238	elaboração e impressão de cartas	3 d	Thu 08-09-11	Mon 12-09-11	261					
239	envio de cartas CPBA	0 d	Mon 12-09-11	Mon 12-09-11	238					
240	Contrato	471 d	Thu 08-07-10	Wed 23-05-12						

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada Date: Wed 07-07-10	Task		Rolled Up Task		External Tasks	
	Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
	Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
	Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
	Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
241	Aquisição da Cartografia de Suporte	110 d	Thu 08-07-10	Wed 15-12-10						
242	início dos trabalhos bloco A	0 d	Thu 08-07-10	Thu 08-07-10	77FS+12 d					
243	Execução dos trabalhos da Cartografia	75 d	Fri 09-07-10	Fri 22-10-10	242					
244	entrega morada locais gabinetes de ate	0 d	Fri 23-07-10	Fri 23-07-10	243SS+11 d					
245	buffer execução BA	10 d	Mon 25-10-10	Mon 08-11-10	243					
246	entrega cartografia de suporte BA	0 d	Mon 08-11-10	Mon 08-11-10	243;245					
247	buffer rectificação após entrega BA	10 d	Tue 23-11-10	Tue 07-12-10	281					
248	entrega final cartografia de suporte BA	0 d	Tue 07-12-10	Tue 07-12-10	247					
249	Aceitação das ortofotos BA	0 d	Wed 15-12-10	Wed 15-12-10	282;281					
250	Aquisição dos Dados Cadastrais	280 d	Mon 25-10-10	Tue 06-12-11						
251	Execução da Aquisição dos Dados Cac	210 d	Mon 25-10-10	Thu 25-08-11	242FS+75 d					
252	Entrega intercalar 1 BA	0 d	Tue 23-11-10	Tue 23-11-10	251SS+21 d					
253	Entrega intercalar 2 BA	0 d	Fri 24-12-10	Fri 24-12-10	252SS+21 d					
254	Entrega intercalar 3 BA	0 d	Mon 24-01-11	Mon 24-01-11	253SS+21 d					
255	Entrega intercalar 4 BA	0 d	Tue 22-02-11	Tue 22-02-11	254SS+21 d					
256	Entrega intercalar 5 BA	0 d	Thu 24-03-11	Thu 24-03-11	255SS+21 d					
257	Entrega intercalar 6 BA	0 d	Tue 26-04-11	Tue 26-04-11	256SS+21 d					
258	Entrega intercalar 7 BA	0 d	Wed 25-05-11	Wed 25-05-11	257SS+21 d					
259	Entrega intercalar 8 BA	0 d	Mon 27-06-11	Mon 27-06-11	258SS+21 d					
260	Entrega intercalar 9 BA	0 d	Tue 26-07-11	Tue 26-07-11	259SS+21 d					
261	entrega morada locais da consulta publ	0 d	Thu 08-09-11	Thu 08-09-11	263FS-21 d					
262	buffer execução BA	30 d	Fri 26-08-11	Fri 07-10-11	251					
263	Entrega caracterização provisória BA	0 d	Fri 07-10-11	Fri 07-10-11	251;262					
264	buffer rectificação entrega BA	20 d	Mon 24-10-11	Mon 21-11-11	295					
265	entrega final caracterização provisória f	0 d	Mon 21-11-11	Mon 21-11-11	264					
266	aceitação caracterização provisória DC	0 d	Tue 06-12-11	Tue 06-12-11	295;296					
267	Consulta Pública e Rectificação Dados	116 d	Wed 07-12-11	Wed 23-05-12						
268	Realização da Consulta Pública e recep	68 d	Wed 07-12-11	Tue 13-03-12	236FS+21 d;267					
269	buffer consulta pública BA	10 d	Wed 14-03-12	Tue 27-03-12	268					
270	envio dos processos de reclamação BA	0 d	Tue 27-03-12	Tue 27-03-12	269;268					
271	rectificação dados de processos tipo 1	10 d	Fri 13-04-12	Fri 27-04-12	300					
272	entrega da caracterização definitiva1 B	0 d	Fri 27-04-12	Fri 27-04-12	271					
273	Aceitação da caracterização definitiva t	0 d	Thu 03-05-12	Thu 03-05-12	302					
274	rectificação dados de processos tipo 2	5 d	Mon 14-05-12	Fri 18-05-12	304					
275	entrega da caracterização definitiva2 B	0 d	Fri 18-05-12	Fri 18-05-12	274					
276	Aceitação da caracterização definitiva t	0 d	Wed 23-05-12	Wed 23-05-12	306					
277	Fiscalização e Apoio Técnico	471 d	Fri 09-07-10	Wed 23-05-12						
278	Aquisição Cartografia de Suporte	110 d	Fri 09-07-10	Wed 15-12-10						
279	Apoio Técnico e acções de fiscalizaçã	75 d	Fri 09-07-10	Fri 22-10-10	243SS					
280	buffer apoio técnico CSBA	10 d	Mon 25-10-10	Mon 08-11-10	245SS					

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada Date: Wed 07-07-10	Task		Rolled Up Task		External Tasks	
	Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
	Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
	Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
	Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
281	Elaboração de teste de qualidade CSB,	10 d	Tue 09-11-10	Mon 22-11-10	246					
282	buffer elaboração de teste de qualidade	5 d	Thu 09-12-10	Wed 15-12-10	248					
283	Aquisição dos dados cadastrais	280 d	Mon 25-10-10	Tue 06-12-11						
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	210 d	Mon 25-10-10	Thu 25-08-11	251SS					
285	Validação Entrega intercalar 1 DCBA	7 d	Wed 24-11-10	Fri 03-12-10	252					
286	Validação Entrega intercalar 2 DCBA	7 d	Mon 27-12-10	Tue 04-01-11	253					
287	Validação Entrega intercalar 3 DCBA	7 d	Tue 25-01-11	Wed 02-02-11	254					
288	Validação Entrega intercalar 4 DCBA	7 d	Wed 23-02-11	Thu 03-03-11	255					
289	Validação Entrega intercalar 5 DCBA	7 d	Fri 25-03-11	Mon 04-04-11	256					
290	Validação Entrega intercalar 6 DCBA	7 d	Wed 27-04-11	Thu 05-05-11	257					
291	Validação Entrega intercalar 7 DCBA	7 d	Thu 26-05-11	Fri 03-06-11	258					
292	Validação Entrega intercalar 8 DCBA	7 d	Tue 28-06-11	Wed 06-07-11	259					
293	Validação Entrega intercalar 9 DCBA	7 d	Wed 27-07-11	Thu 04-08-11	260					
294	buffer apoio técnico DCBA	30 d	Fri 26-08-11	Fri 07-10-11	262SS					
295	elaboração de testes de aceitação DCE	10 d	Mon 10-10-11	Fri 21-10-11	263					
296	buffer elaboração de testes de aceitação	10 d	Tue 22-11-11	Tue 06-12-11	265					
297	Consulta Pública e Rectificação Dados	116 d	Wed 07-12-11	Wed 23-05-12						
298	Análise de reclamações BA	79 d	Wed 07-12-11	Wed 28-03-12	268SS					
299	buffer análises de reclamações BA	10 d	Thu 29-03-12	Thu 12-04-12	298					
300	Envio processos tipo 1 Adjudicatário B/	0 d	Thu 12-04-12	Thu 12-04-12	298;299					
301	envio processos notificação interessados	0 d	Thu 12-04-12	Thu 12-04-12	298;299					
302	Elaboração de testes de aceitação cara	3 d	Mon 30-04-12	Thu 03-05-12	272					
303	Audição Interessados, Decisão Final e	16 d	Wed 18-04-12	Fri 11-05-12	301FS+3 d					
304	envio dos processos para alterações a	0 d	Fri 11-05-12	Fri 11-05-12	303					
305	notificação interessados BA	0 d	Fri 11-05-12	Fri 11-05-12	303					
306	Elaboração de testes de aceitação cara	3 d	Mon 21-05-12	Wed 23-05-12	275					
307	Bloco B	479 d	Thu 25-08-11	Wed 24-07-13						
308	Publicitação	287 d	Mon 12-09-11	Wed 31-10-12						
309	Início operação	39 d	Mon 12-09-11	Mon 07-11-11						
310	Campanha de publicitação	2 d	Mon 12-09-11	Tue 13-09-11						
311	elaboração de editais e anúncios I	2 d	Mon 12-09-11	Tue 13-09-11	330					
312	envio para afixação e comunicação	0 d	Tue 13-09-11	Tue 13-09-11	311					
313	Ações de sensibilização	28 d	Tue 27-09-11	Mon 07-11-11						
314	preparação de acções de sensibili	2 d	Tue 27-09-11	Wed 28-09-11	318FS+5 d					
315	acções de sensibilização freguesia	26 d	Thu 29-09-11	Mon 07-11-11	314					
316	Notificação directa da operação	6 d	Mon 12-09-11	Mon 19-09-11						
317	elaboração e impressão de cartas	6 d	Mon 12-09-11	Mon 19-09-11	330					
318	envio de cartas IOBB	0 d	Mon 19-09-11	Mon 19-09-11	317					
319	Consulta pública	4 d	Fri 26-10-12	Wed 31-10-12						
320	Campanha de publicitação	1 d	Fri 26-10-12	Fri 26-10-12						

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
321	elaboração de editais e anúncios C	1 d	Fri 26-10-12	Fri 26-10-12	347					
322	envio para afixação e comunicação	0 d	Fri 26-10-12	Fri 26-10-12	321					
323	Notificação directa da consulta públi	4 d	Fri 26-10-12	Wed 31-10-12						
324	elaboração e impressão de cartas	4 d	Fri 26-10-12	Wed 31-10-12	347					
325	envio de cartas CPBB	0 d	Wed 31-10-12	Wed 31-10-12	324					
326	Contrato	471 d	Thu 25-08-11	Fri 12-07-13						
327	Aquisição da Cartografia de Suporte	110 d	Thu 25-08-11	Wed 01-02-12						
328	inico trabalhos bloco B	0 d	Thu 25-08-11	Thu 25-08-11	242FS+285 d					
329	Execução dos trabalhos cartografia de	75 d	Fri 26-08-11	Wed 14-12-11	328					
330	entrega moradas gabinetes de atendim	0 d	Fri 09-09-11	Fri 09-09-11	329SS+11 d					
331	buffer execução dos trabalhos da carto	10 d	Thu 15-12-11	Wed 28-12-11	329					
332	entrega cartografia de suporte BB	0 d	Wed 28-12-11	Wed 28-12-11	329;331					
333	buffer rectificação cartografia após entr	10 d	Thu 12-01-12	Wed 25-01-12	368					
334	entrega final cartografia de suporte BB	0 d	Wed 25-01-12	Wed 25-01-12	333					
335	Aceitação das ortofotos CSBB	0 d	Wed 01-02-12	Wed 01-02-12	369					
336	Aquisição dos Dados Cadastrais	280 d	Thu 15-12-11	Wed 23-01-13						
337	Execução dos trabalhos de Aquisição c	210 d	Thu 15-12-11	Fri 12-10-12	242FS+360 d;3					
338	Entrega intercalar 1 BB	0 d	Thu 12-01-12	Thu 12-01-12	337SS+21 d					
339	Entrega intercalar 2 BB	0 d	Fri 10-02-12	Fri 10-02-12	338SS+21 d					
340	Entrega intercalar 3 BB	0 d	Tue 13-03-12	Tue 13-03-12	339SS+21 d					
341	Entrega intercalar 4 BB	0 d	Thu 12-04-12	Thu 12-04-12	340SS+21 d					
342	Entrega intercalar 5 BB	0 d	Tue 15-05-12	Tue 15-05-12	341SS+21 d					
343	Entrega intercalar 6 BB	0 d	Thu 14-06-12	Thu 14-06-12	342SS+21 d					
344	Entrega intercalar 7 BB	0 d	Fri 13-07-12	Fri 13-07-12	343SS+21 d					
345	Entrega intercalar 8 BB	0 d	Mon 13-08-12	Mon 13-08-12	344SS+21 d					
346	Entrega intercalar 9 BB	0 d	Wed 12-09-12	Wed 12-09-12	345SS+21 d					
347	entrega morada locais da consulta publ	0 d	Fri 26-10-12	Fri 26-10-12	349FS-21 d					
348	buffer execução BB	30 d	Mon 15-10-12	Mon 26-11-12	337					
349	Entrega caracterização provisória BB	0 d	Mon 26-11-12	Mon 26-11-12	337;348					
350	buffer rectificação caracterização provis	20 d	Tue 11-12-12	Wed 09-01-13	382					
351	Entrega final da caracterização provisó	0 d	Wed 09-01-13	Wed 09-01-13	350					
352	Aceitação caracterização provisória DC	0 d	Wed 23-01-13	Wed 23-01-13	383					
353	Consulta Pública e Rectificação dos Dado	116 d	Thu 24-01-13	Fri 12-07-13						
354	Realização da Consulta Pública, Recep	68 d	Thu 24-01-13	Fri 03-05-13	352;322FS+21 d					
355	buffer realização da consulta pública B	10 d	Mon 06-05-13	Fri 17-05-13	354					
356	envio processos de reclamações BB	0 d	Fri 17-05-13	Fri 17-05-13	354;355					
357	rectificação dados de processos tipo 1	10 d	Wed 05-06-13	Wed 19-06-13	387					
358	entrega da caracterização definitiva1 B	0 d	Wed 19-06-13	Wed 19-06-13	357					
359	Aceitação da caracterização definitiva 1	0 d	Mon 24-06-13	Mon 24-06-13	389					
360	rectificação dados de processos tipo 2	5 d	Wed 03-07-13	Tue 09-07-13	391					

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2010				
						Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr
361	entrega da caracterização definitiva2 B	0 d	Tue 09-07-13	Tue 09-07-13	360					
362	Aceitação da caracterização definitiva 2	0 d	Fri 12-07-13	Fri 12-07-13	393					
363	entrega relatório de fecho	0 d	Fri 12-07-13	Fri 12-07-13	362					
364	Fiscalização e Apoio Técnico	479 d	Fri 26-08-11	Wed 24-07-13						
365	Cartografia de Suporte	110 d	Fri 26-08-11	Wed 01-02-12						
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	75 d	Fri 26-08-11	Wed 14-12-11	329SS					
367	buffer apoio técnico CSBB	10 d	Thu 15-12-11	Wed 28-12-11	331SS					
368	Elaboração de teste de qualidade CSBB	10 d	Thu 29-12-11	Wed 11-01-12	332					
369	buffer elaboração de testes de qualidade	5 d	Thu 26-01-12	Wed 01-02-12	334					
370	Aquisição dados cadastrais	280 d	Thu 15-12-11	Wed 23-01-13						
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	210 d	Thu 15-12-11	Fri 12-10-12	337SS					
372	Validação Entrega intercalar 1 DCBB	7 d	Fri 13-01-12	Mon 23-01-12	338					
373	Validação Entrega intercalar 2 DCBB	7 d	Mon 13-02-12	Wed 22-02-12	339					
374	Validação Entrega intercalar 3 DCBB	7 d	Wed 14-03-12	Thu 22-03-12	340					
375	Validação Entrega intercalar 4 DCBB	7 d	Fri 13-04-12	Mon 23-04-12	341					
376	Validação Entrega intercalar 5 DCBB	7 d	Wed 16-05-12	Thu 24-05-12	342					
377	Validação Entrega intercalar 6 DCBB	7 d	Fri 15-06-12	Mon 25-06-12	343					
378	Validação Entrega intercalar 7 DCBB	7 d	Mon 16-07-12	Tue 24-07-12	344					
379	Validação Entrega intercalar 8 DCBB	7 d	Tue 14-08-12	Thu 23-08-12	345					
380	Validação Entrega intercalar 9 DCBB	7 d	Thu 13-09-12	Fri 21-09-12	346					
381	buffer apoio técnico DCBB	30 d	Mon 15-10-12	Mon 26-11-12	348SS					
382	elaboração de testes de aceitação da c	10 d	Tue 27-11-12	Mon 10-12-12	349					
383	buffer elaboração testes de aceitação D	10 d	Thu 10-01-13	Wed 23-01-13	351					
384	Consulta Pública e Rectificação dos Dado	116 d	Thu 24-01-13	Fri 12-07-13						
385	Análise de reclamações BB	79 d	Thu 24-01-13	Mon 20-05-13	354SS					
386	buffer análises de reclamações BB	10 d	Tue 21-05-13	Tue 04-06-13	385					
387	Envio processos tipo 1 Adjudicatário BE	0 d	Tue 04-06-13	Tue 04-06-13	385;386					
388	envio processos notificação interessado	0 d	Tue 04-06-13	Tue 04-06-13	385;386					
389	Elaboração de testes de aceitação cara	3 d	Thu 20-06-13	Mon 24-06-13	358					
390	Audição Interessados, Decisão Final e	16 d	Tue 11-06-13	Tue 02-07-13	387FS+3 d					
391	Envio processos tipo 2 Adjudicatário BE	0 d	Tue 02-07-13	Tue 02-07-13	390					
392	envio da notificação interessados BB	0 d	Tue 02-07-13	Tue 02-07-13	390					
393	Elaboração de testes de aceitação cara	3 d	Wed 10-07-13	Fri 12-07-13	361					
394	Final da Operação Lote 1	8 d	Mon 15-07-13	Wed 24-07-13						
395	Balanço e validação de todo o trabalho	5 d	Mon 15-07-13	Fri 19-07-13	363					
396	Elaboração do relatório técnico operaçã	3 d	Mon 22-07-13	Wed 24-07-13	395					
397	Relatório Técnico operação aprovado	0 d	Wed 24-07-13	Wed 24-07-13	396					

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10


Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			



Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada Date: Wed 07-07-10	Task		Rolled Up Task		External Tasks	
	Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
	Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
	Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
	Summary		Split			




Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

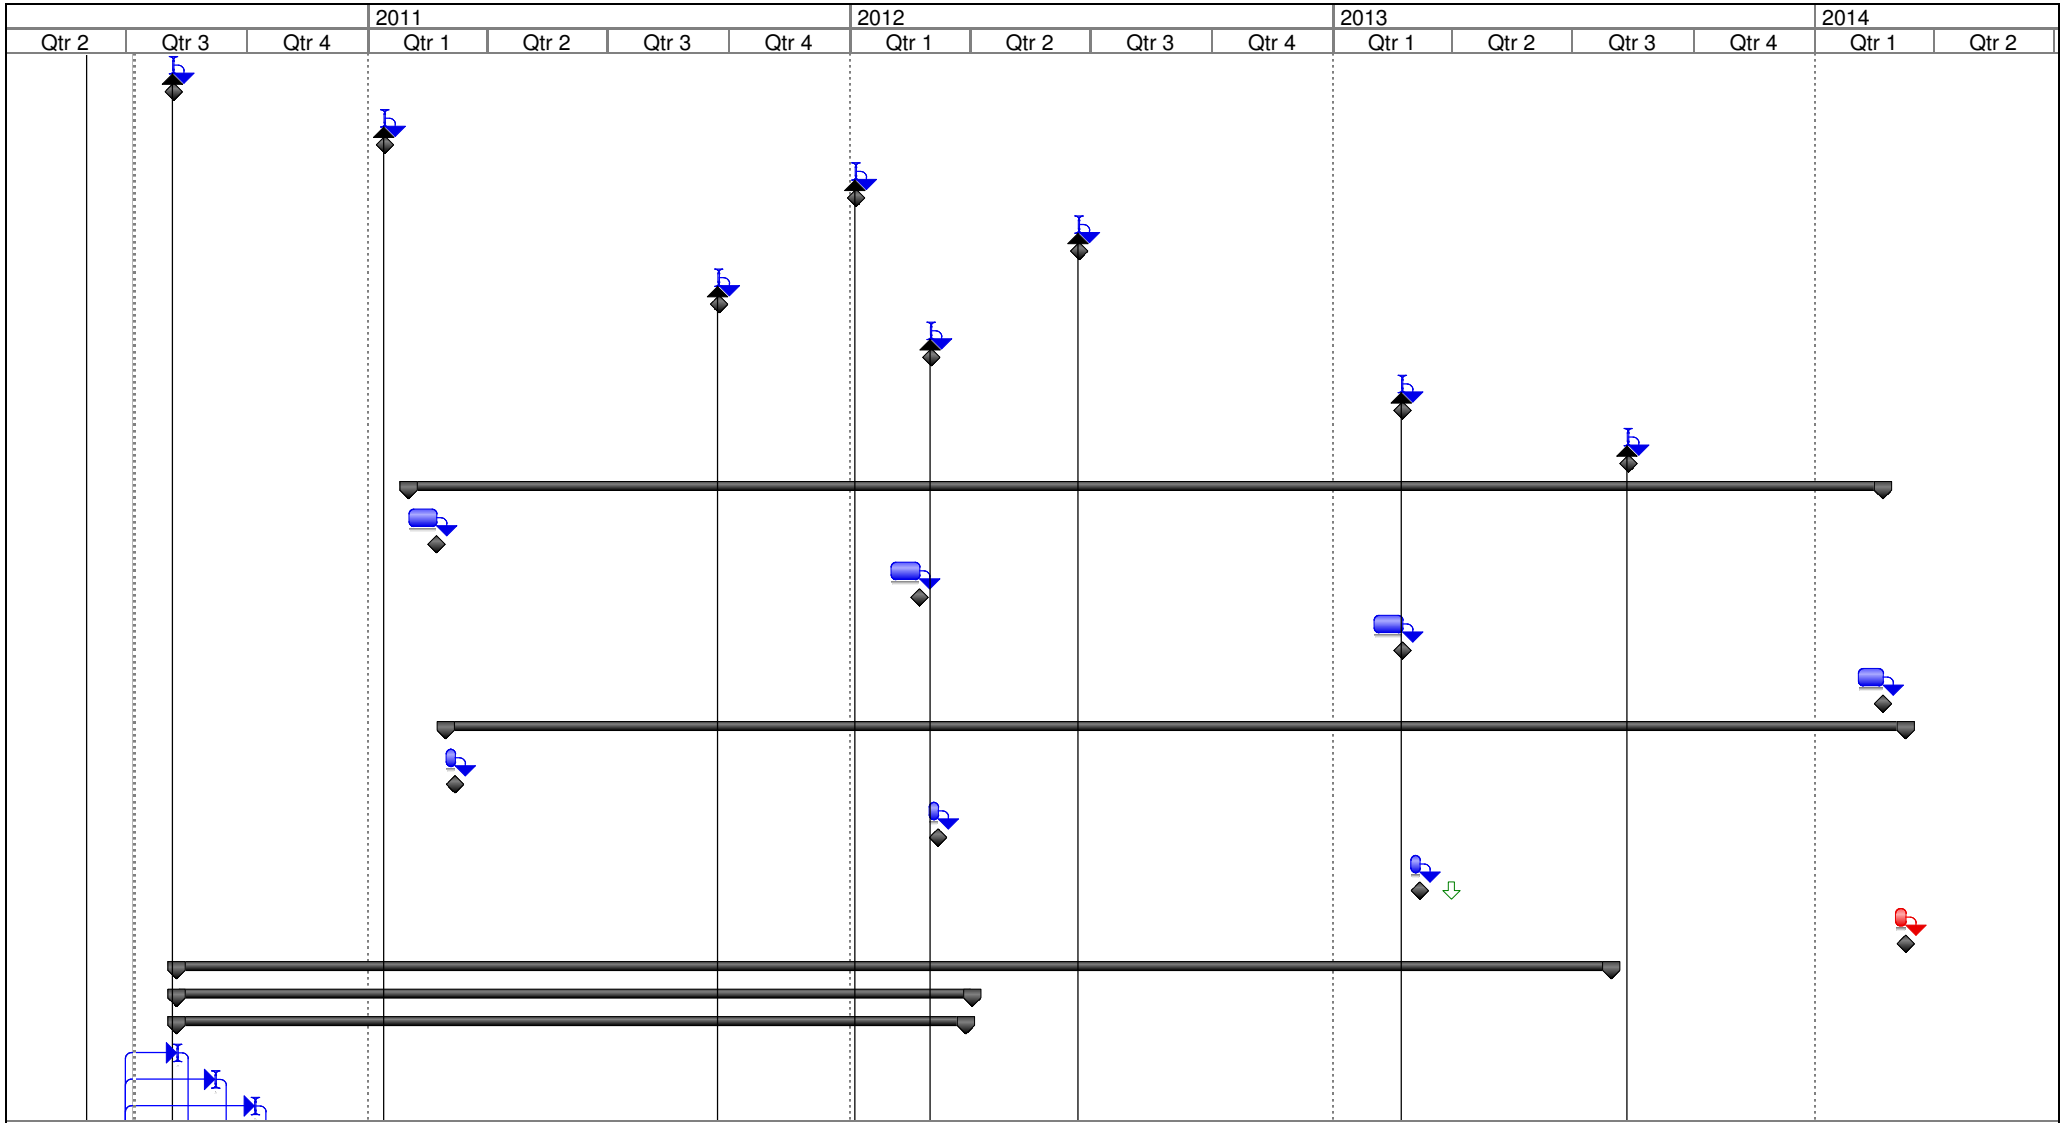


Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
 Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

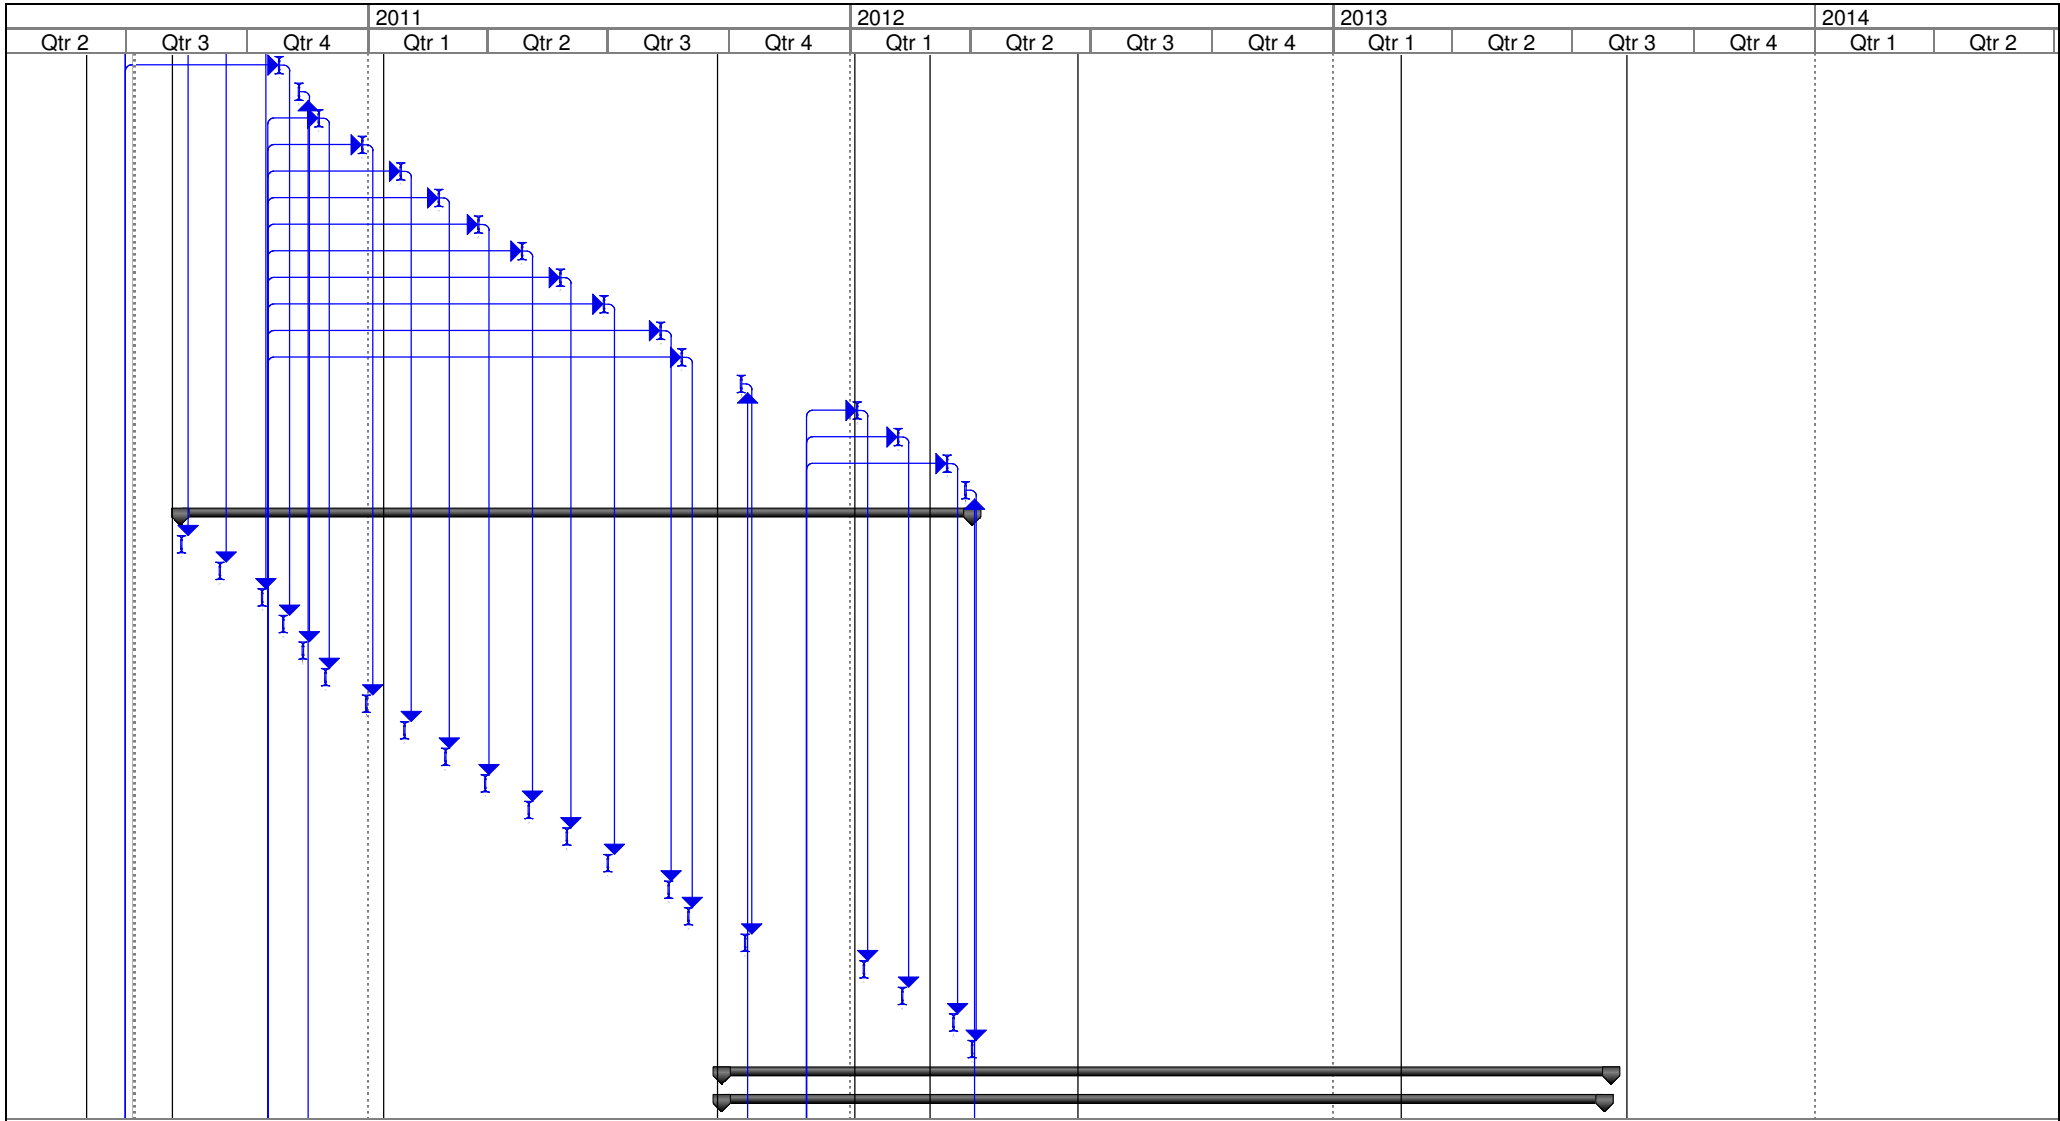


Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
 Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

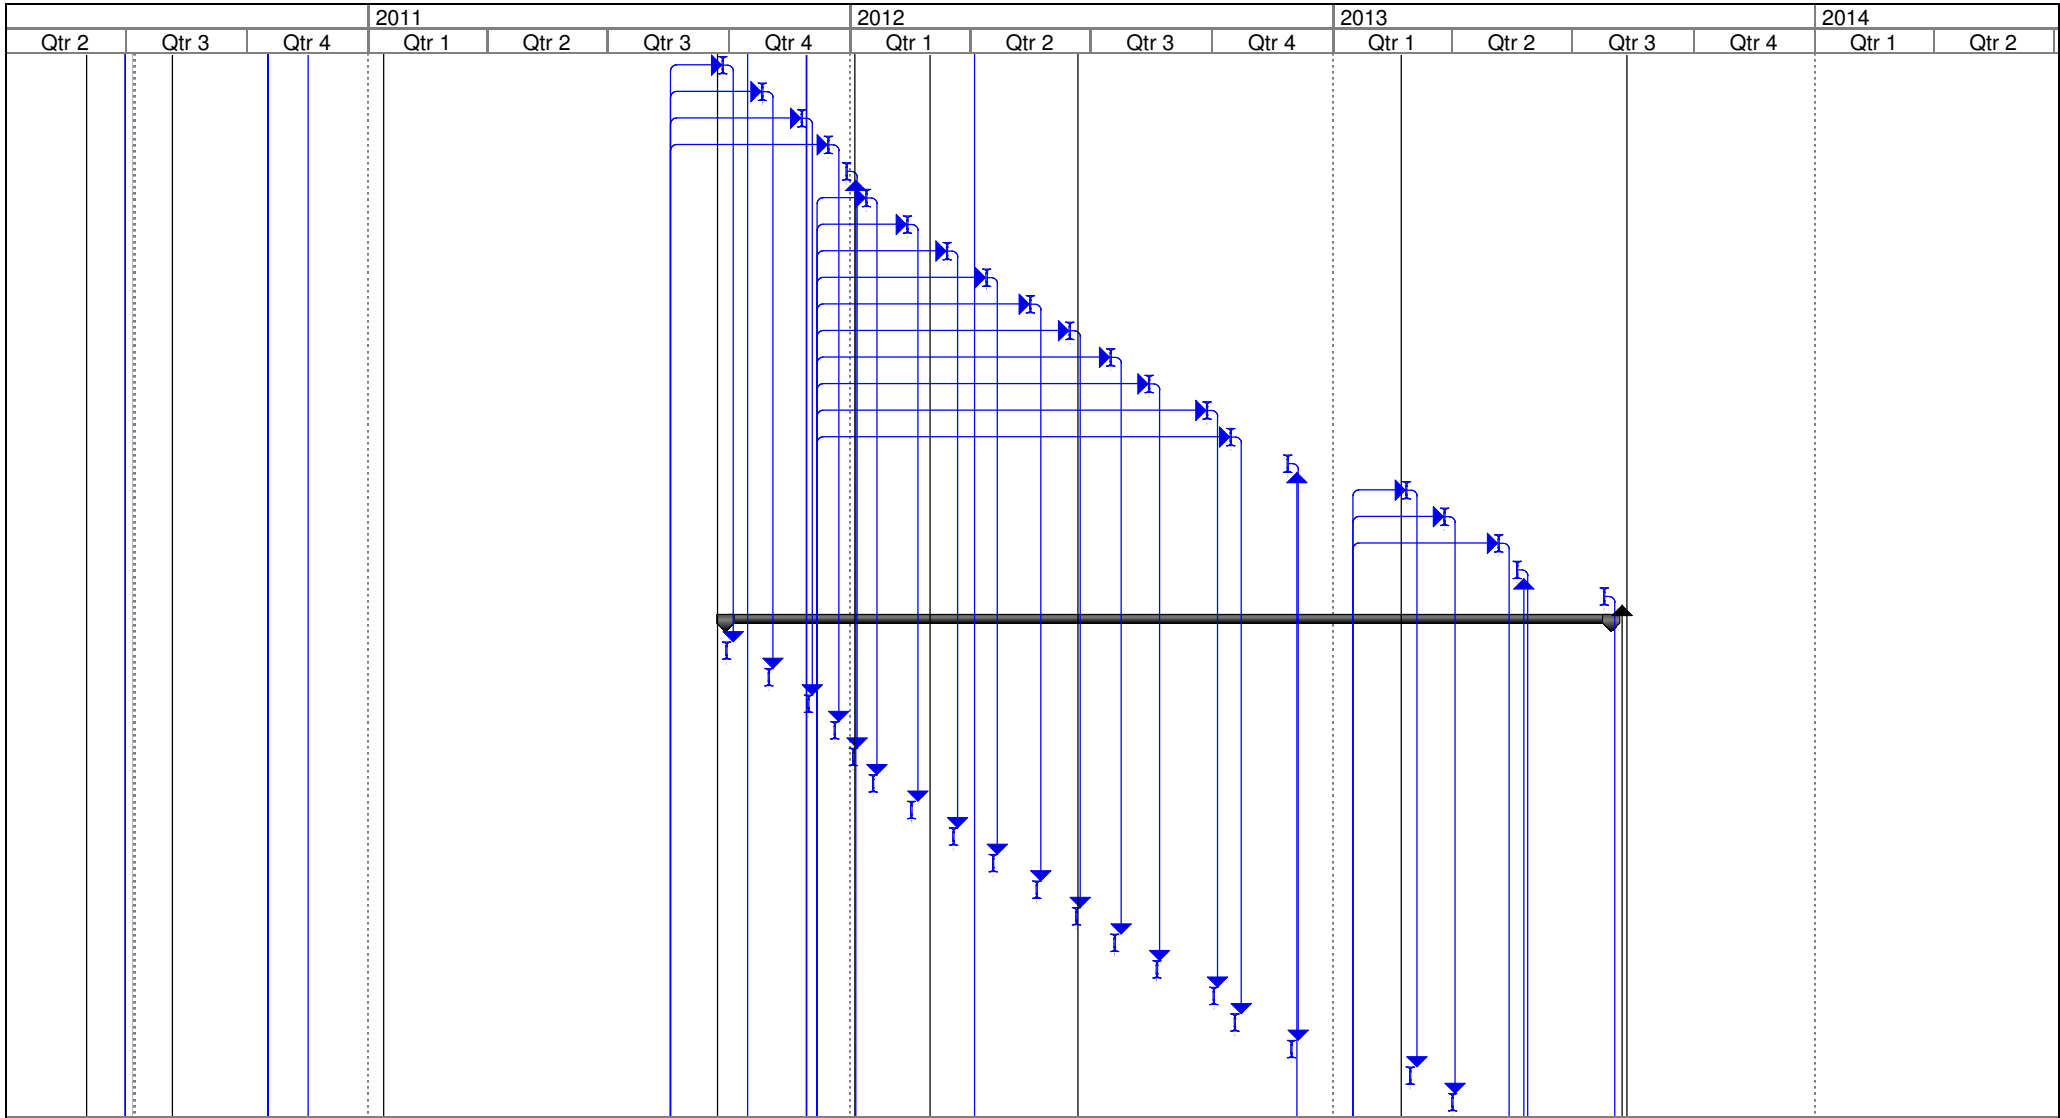


Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
 Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

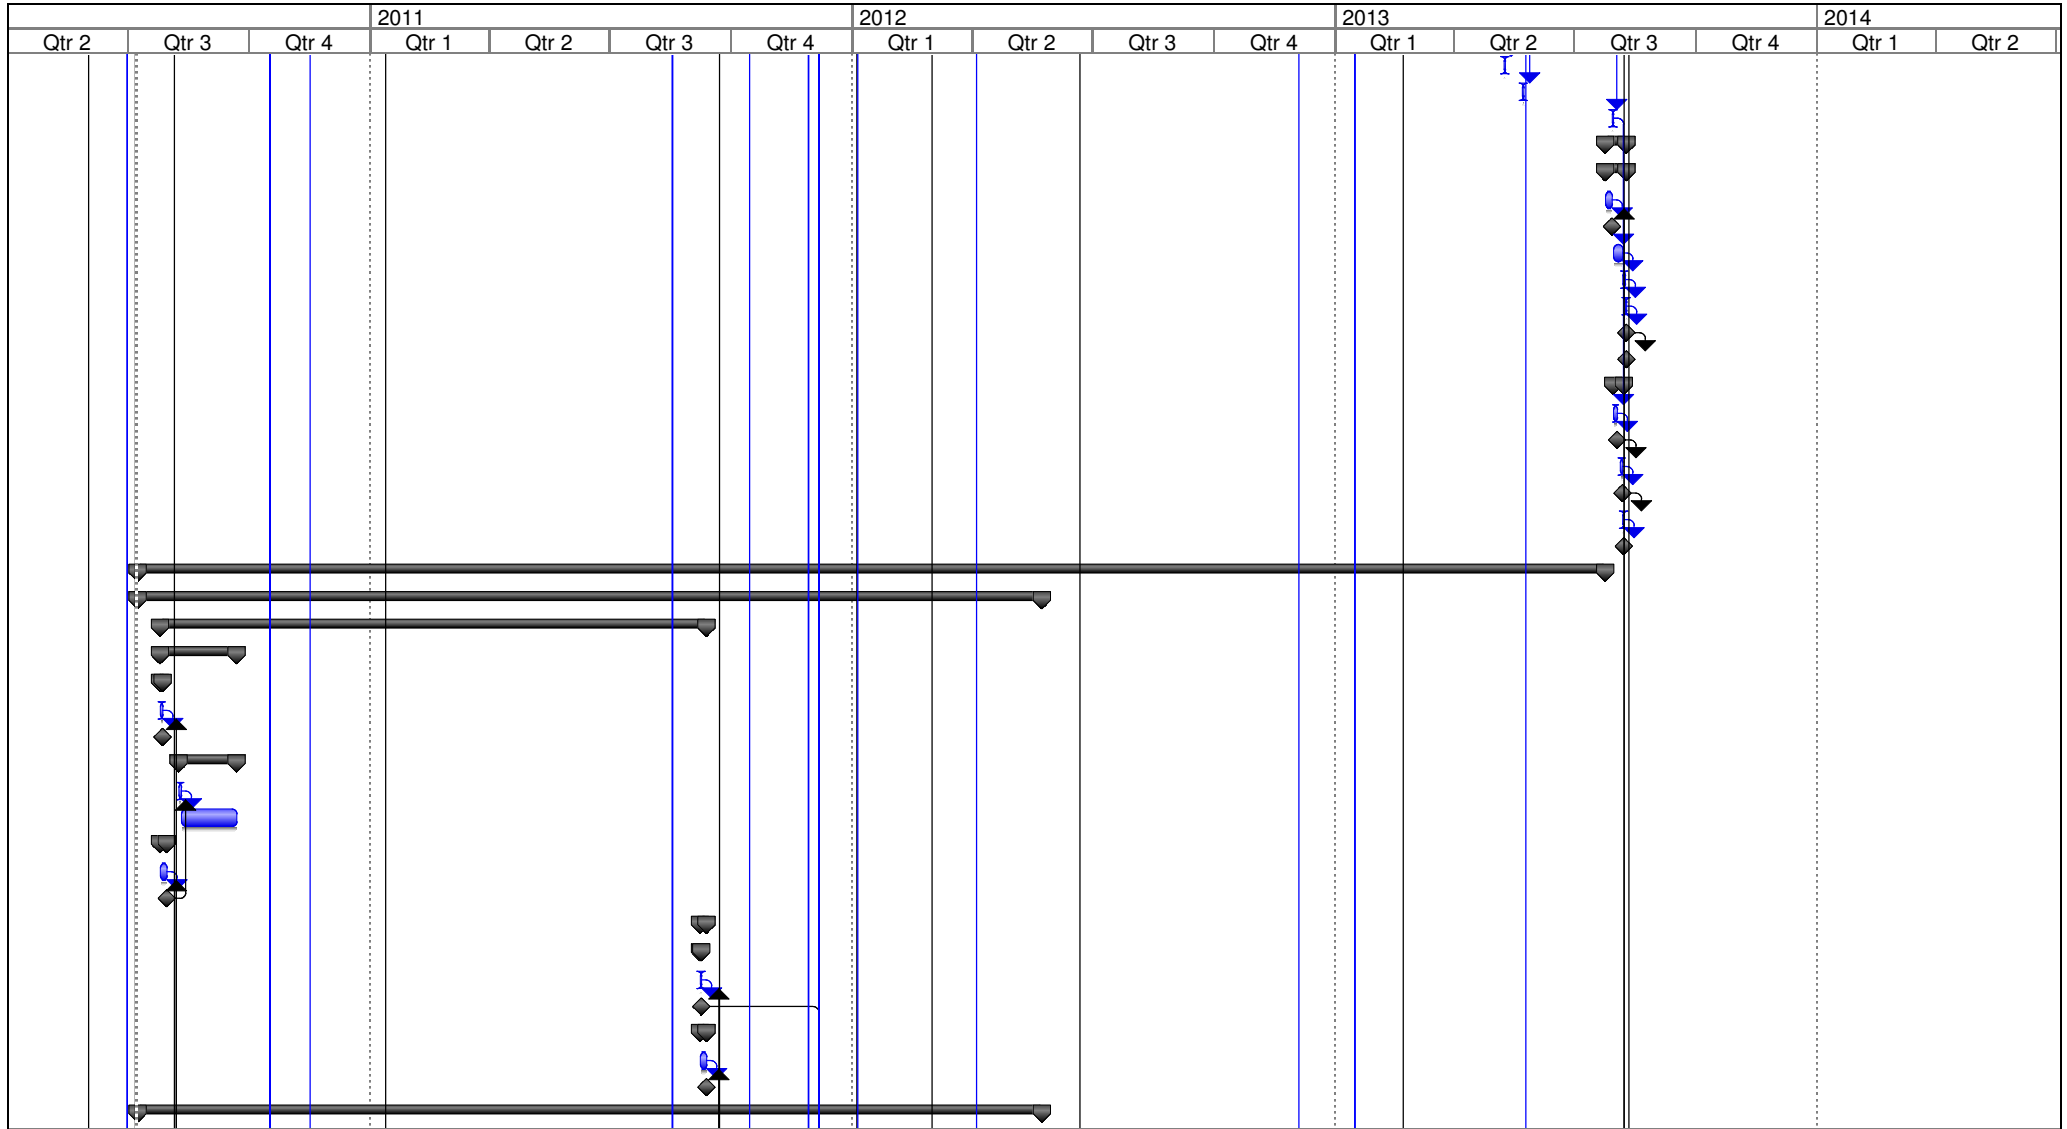


Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
 Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

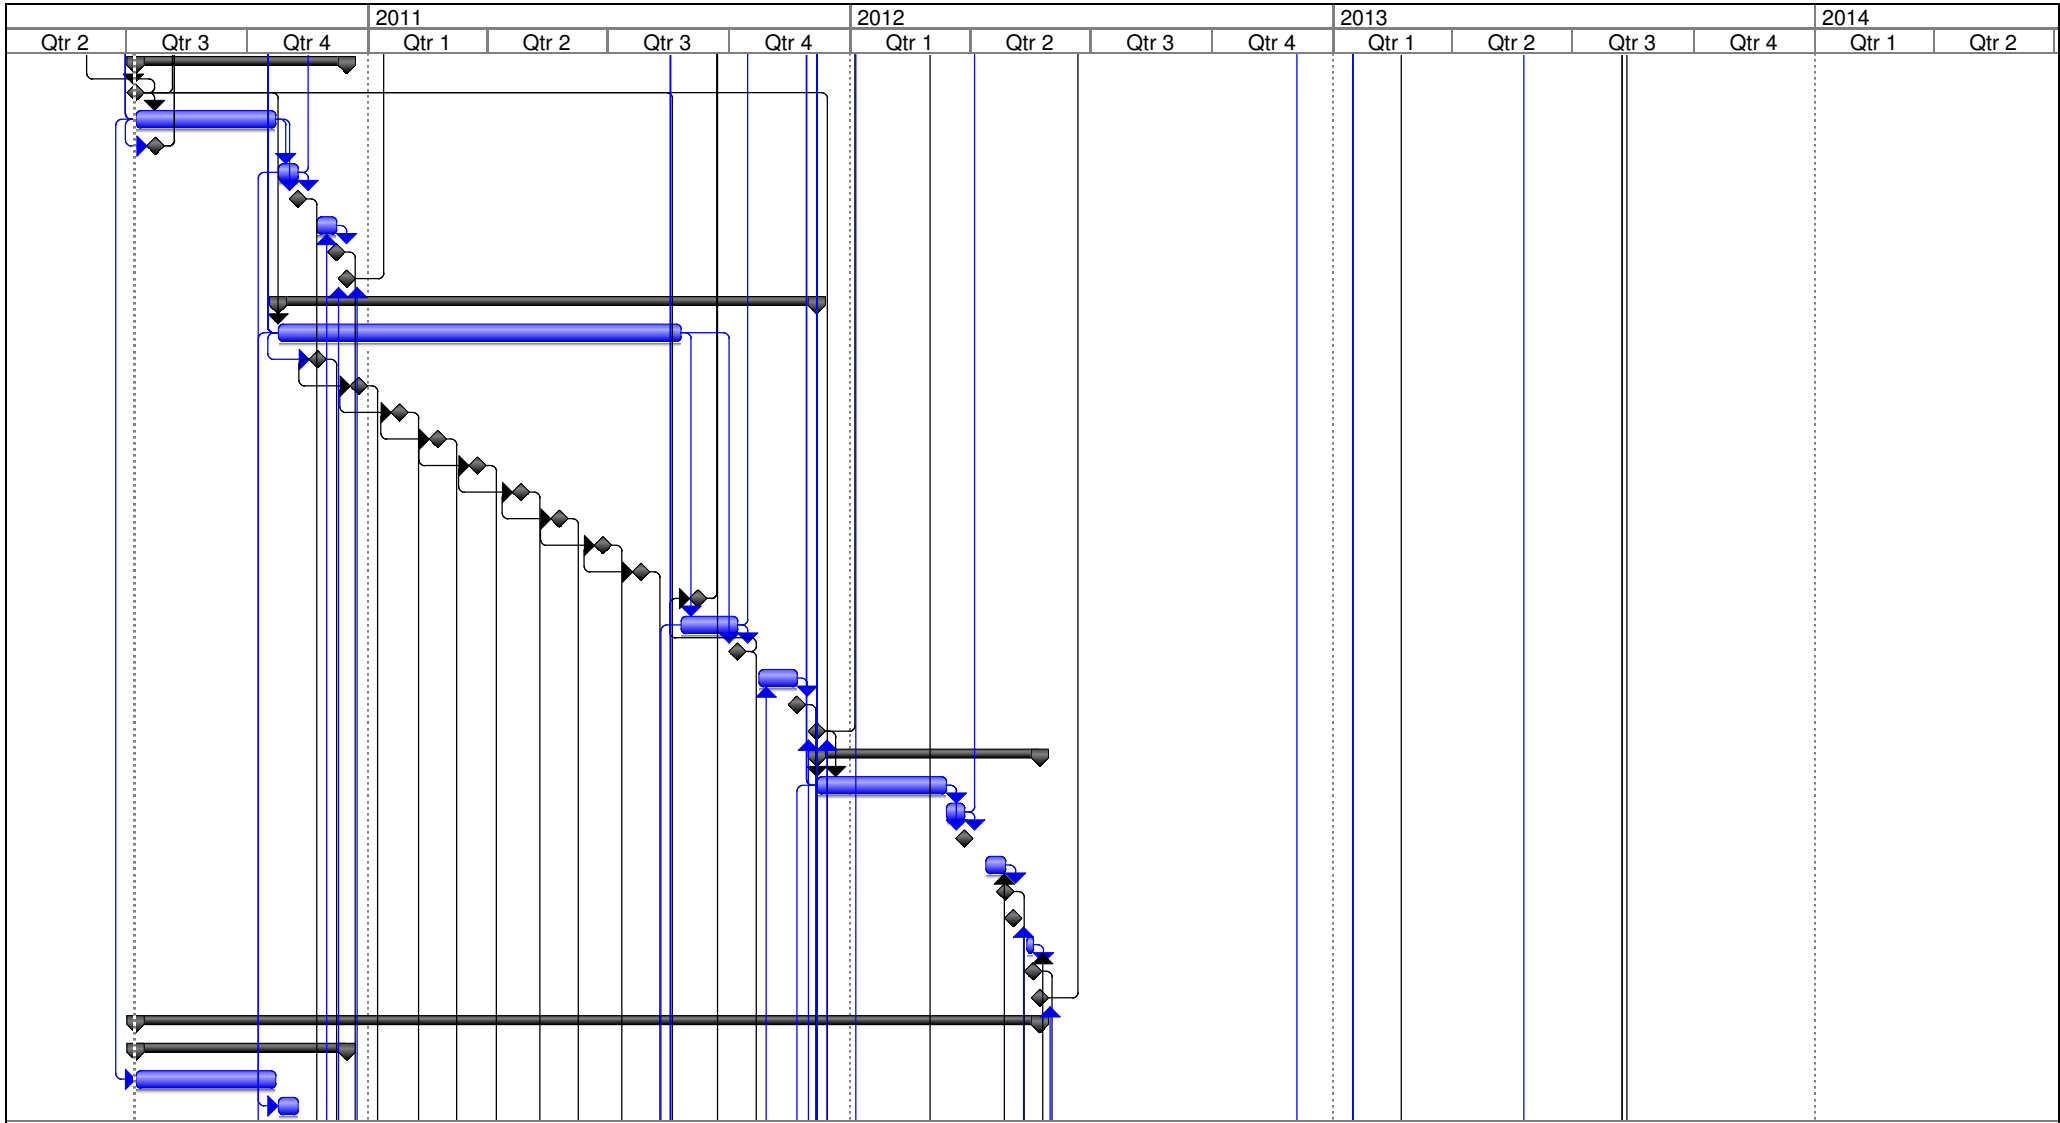


Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

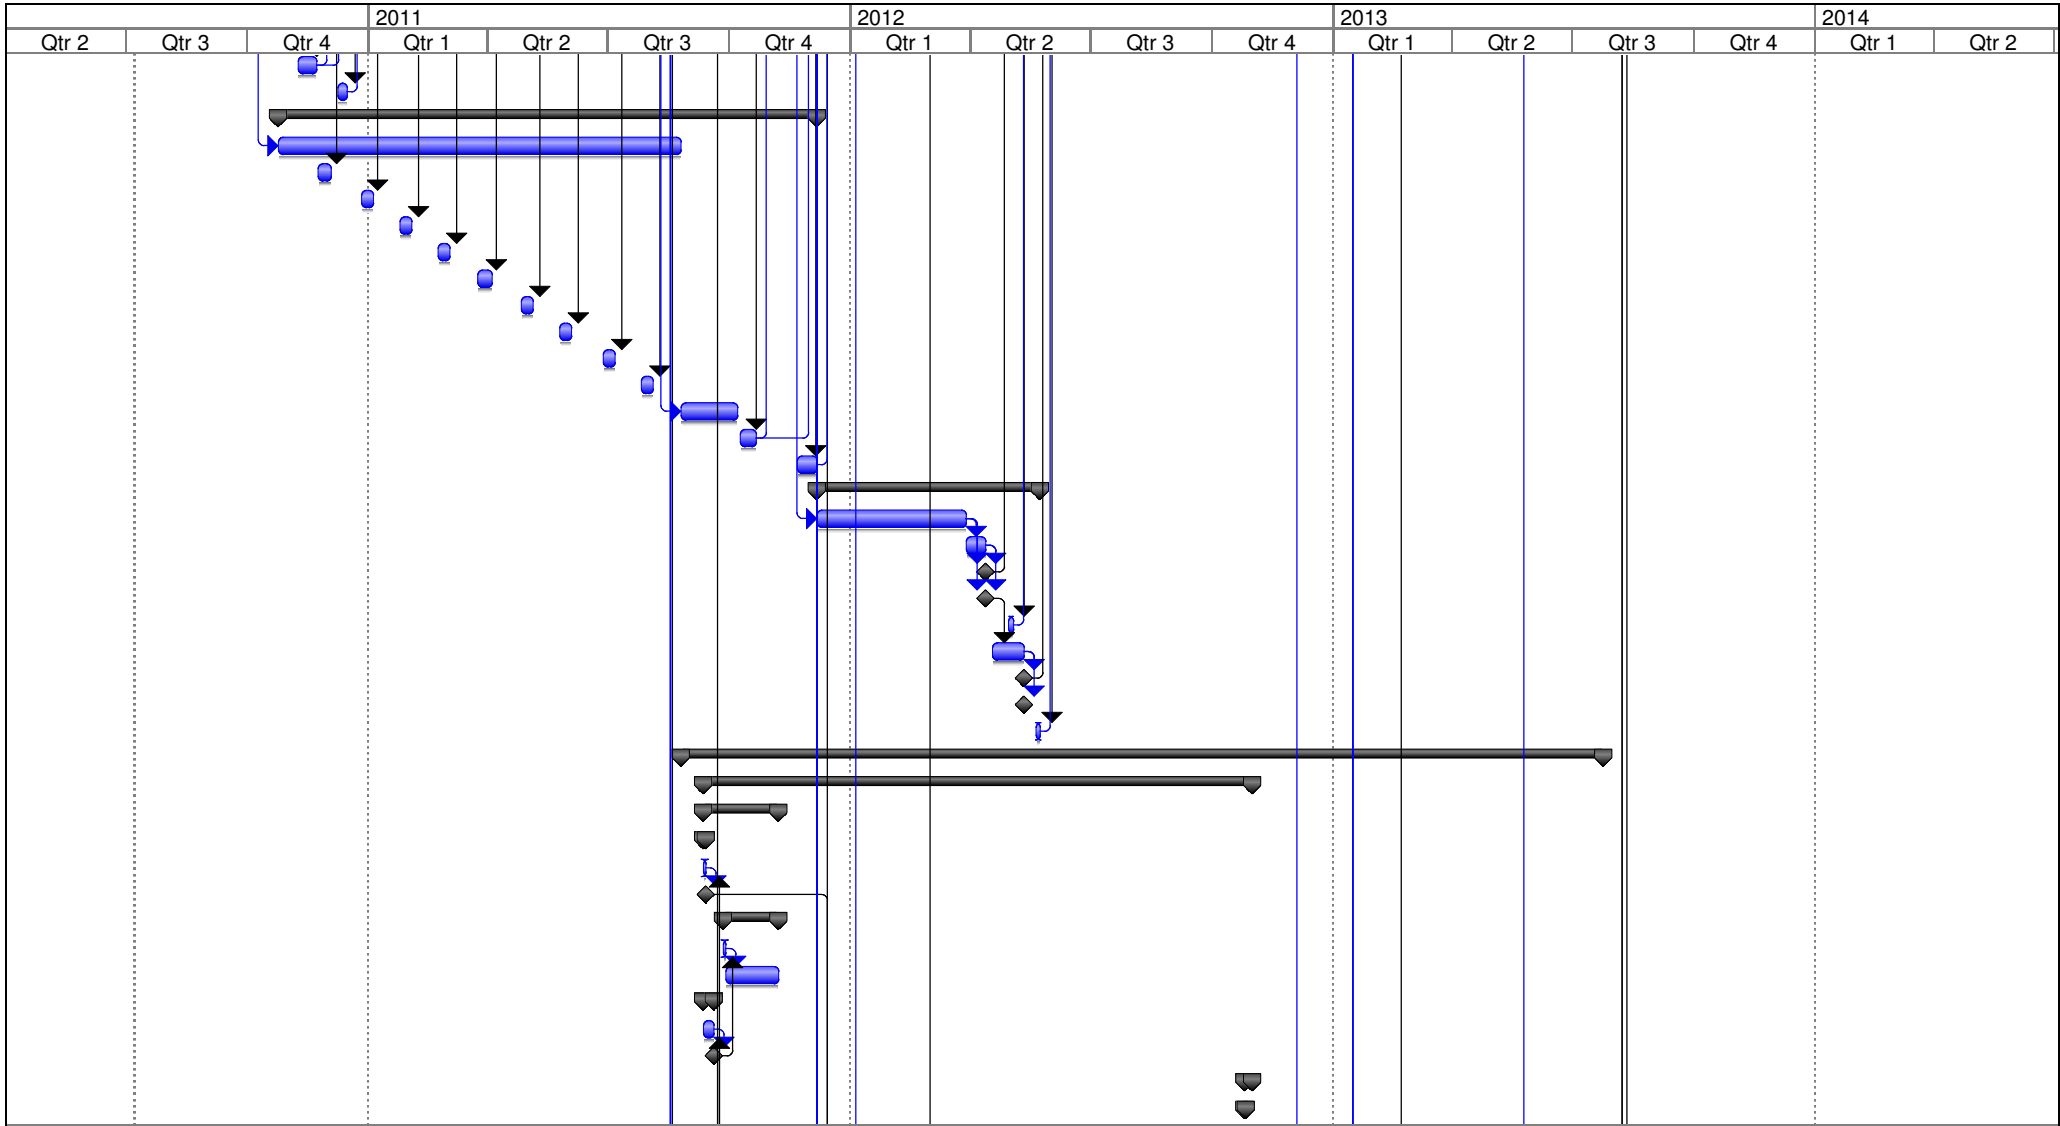


Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
 Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

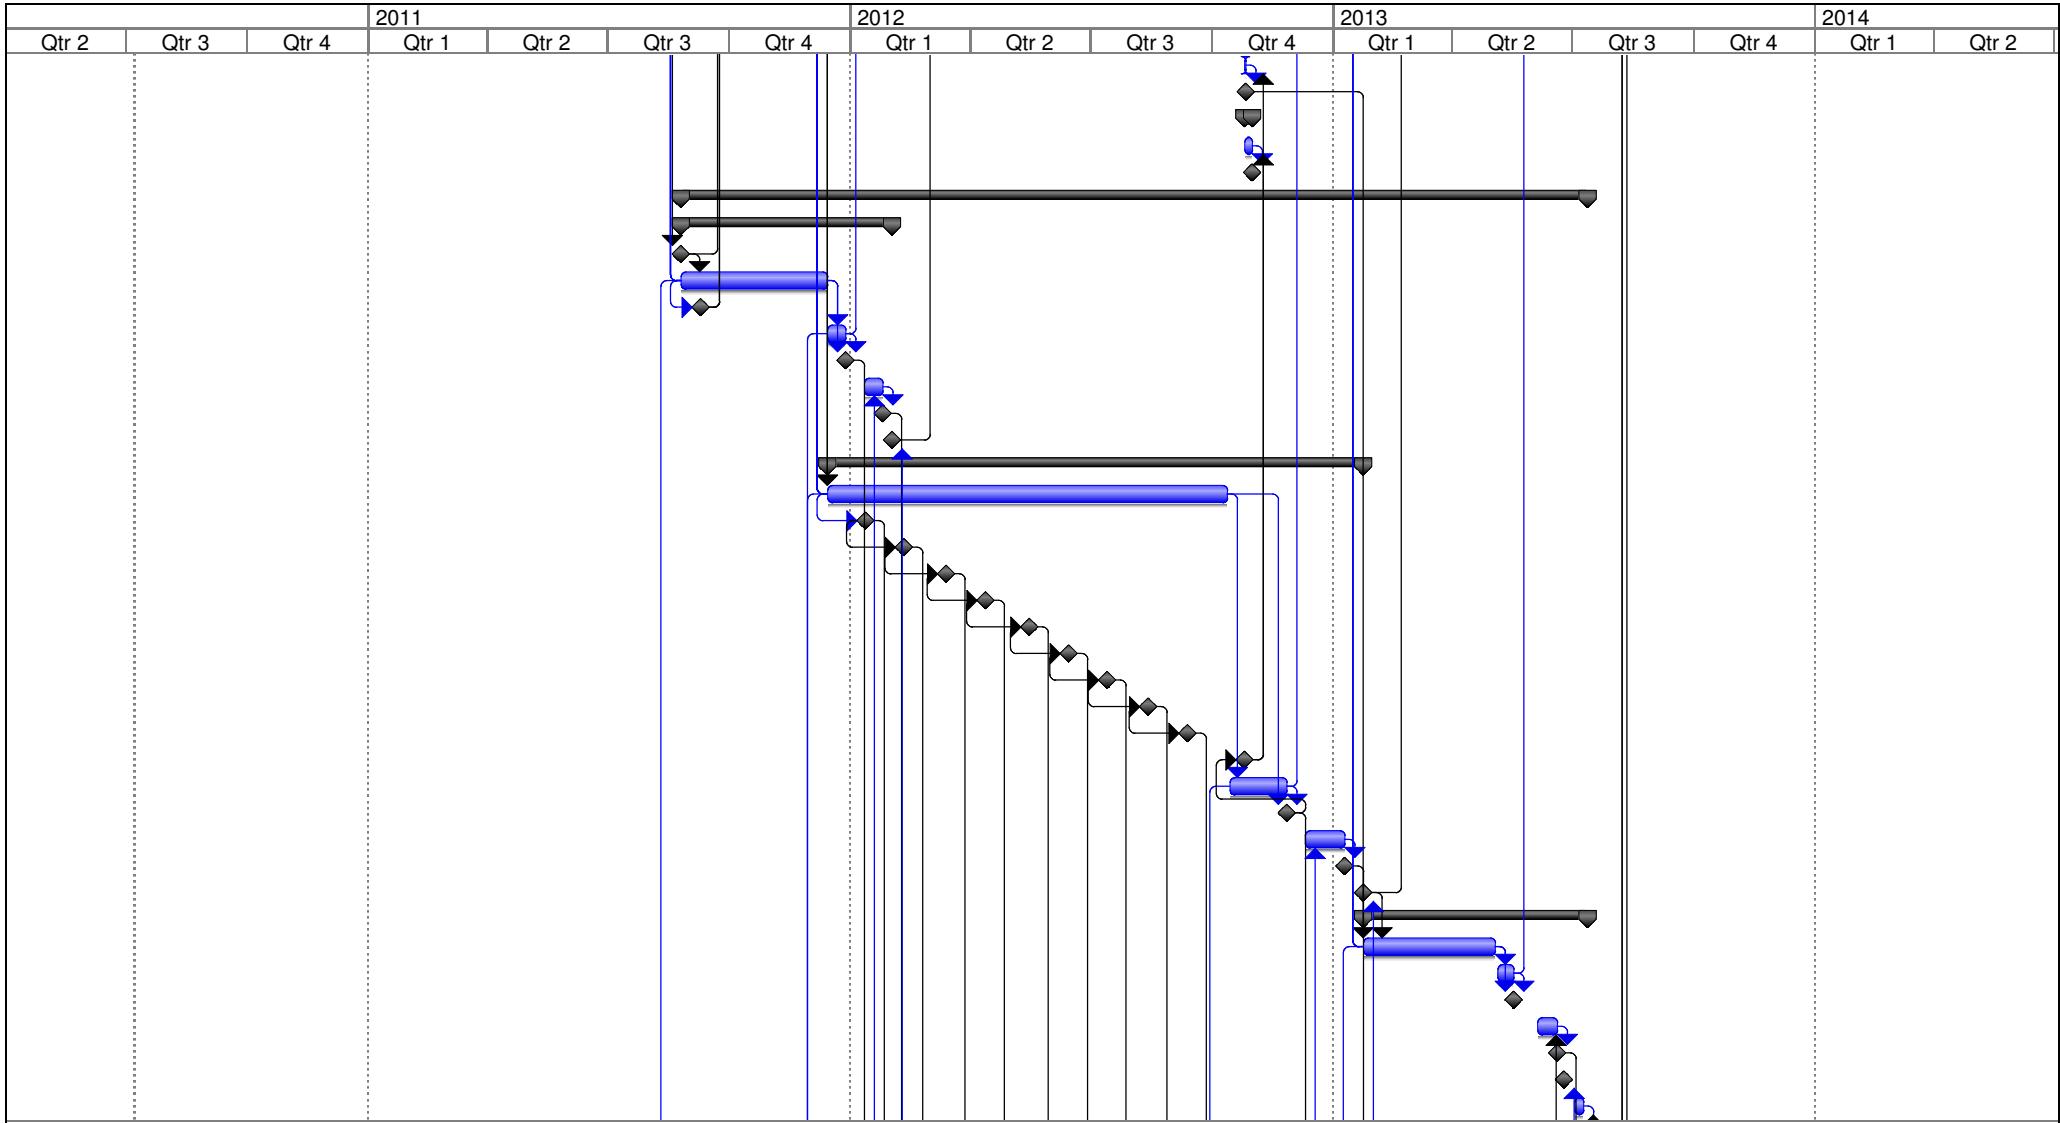

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada
 Date: Wed 07-07-10

Task		Rolled Up Task		External Tasks	
Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
Summary		Split			

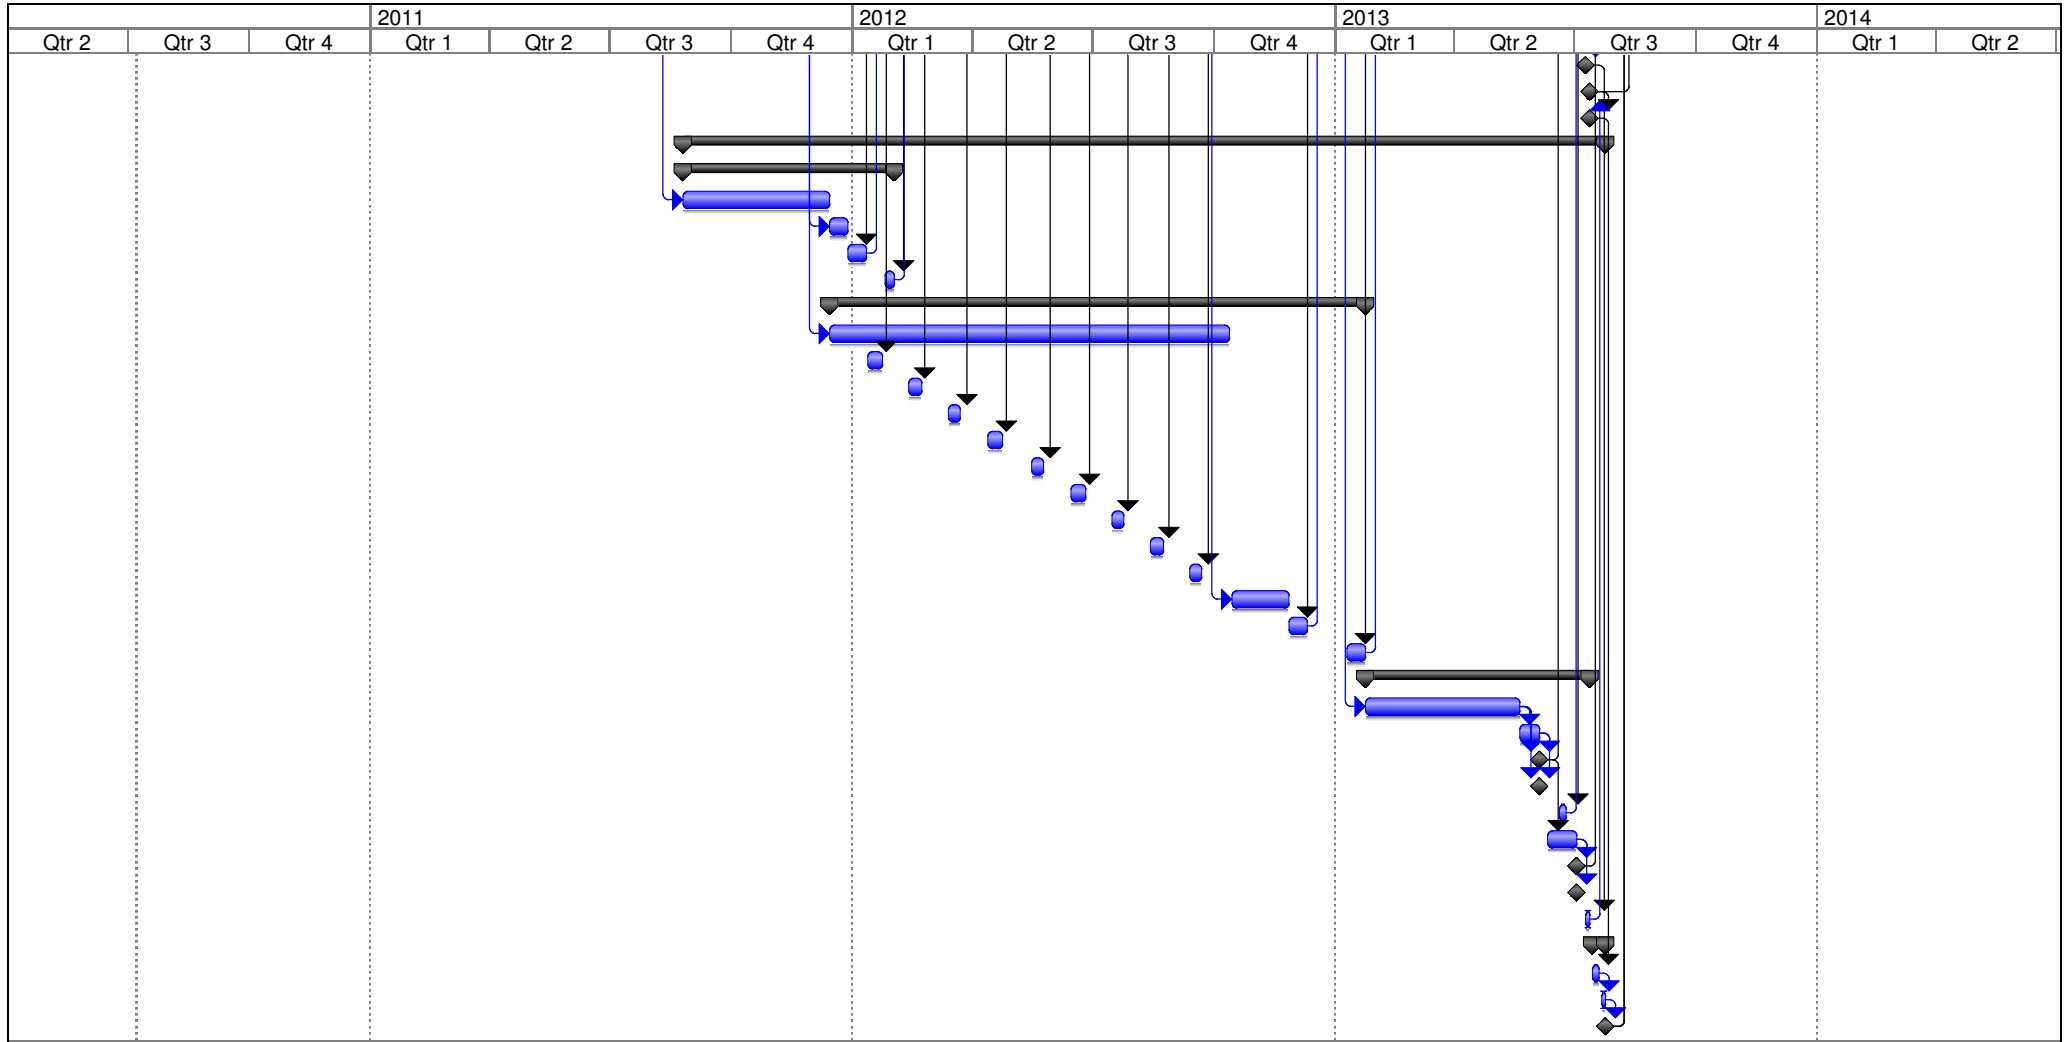

Project: Tese_ProjectoExecuçãoCada Date: Wed 07-07-10	Task		Rolled Up Task		External Tasks	
	Critical Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary	
	Progress		Rolled Up Milestone		Group By Summary	
	Milestone		Rolled Up Progress		Deadline	
	Summary		Split			
